

目次

1. 工場認定書
2. JIS 認証書
3. 配合計画書 (30 - 7 - 20N)
 - ① 配合計画書
 - ② アルカリ骨材反応抑制対策及びアルカリ総量計算書
4. 原材料品質証明
 - ① セメント
 - ② 骨材
 - ③ 水
 - ④ 混和剤
 - ⑤ 鉄筋
5. コンクリート試験管理表
 - ① 圧縮強度管理図
 - ② スランプ管理図
 - ③ 空気量管理図
 - ④ 生コン中の塩化物測定記録
6. 試験機公正証明書
 - ① 圧縮強度試験機 耐圧版の平面度
 - ② 外圧強度試験機
 - ③ トレーサビリティ体系

1. 工場認定書

工場認定書

田中コンクリート工業株式会社

代表取締役 亀谷太郎 殿

秋田県コンクリート製品協会評価委員会が定めた
認定要領に基づき審査を行った結果 下記工場が
製造品質管理基準を満たしていることを認める

認定番号 ACA-04-2

認定工場 田中コンクリート工業株式会社 横手工場

所在地 秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野2-1

有効期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日

認定日 令和8年4月1日

秋田県コンクリート製品協会

会長 小山雄二

同 評価委員会

委員長 徳重英佳

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

2. JIS 認証書

8. 7. 月分

発効日：2025 年 8 月 25 日



Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

田中コンクリート工業株式会社 殿

産業標準化法第 30 条第 1 項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0208076

認証取得者の氏名及び名称：田中コンクリート工業株式会社
住 所：秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野 2 の 1

鉱 工 業 品 の 名 称：プレキャスト鉄筋コンクリート製品

認証に係る JIS 番号：JIS A 5372

認 証 の 区 分：I 類

工場及び事業所の名称：田中コンクリート工業株式会社 横手工場
所 在 地：秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野 2 の 1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2008 年 8 月 25 日
有 効 期 限：2028 年 8 月 24 日



一般財団法人 建材試験センター
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



8. 7. 月分



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

(認証番号:TC0208076)

認証の範囲(種類又は等級) :

プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類

製品の種類	製品
路面排水溝類	落ちふた式U形側溝
用排水路類	ベンチフリューム

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 32mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0208076」を表示する。
- 3) 日本産業規格の種類及び呼びの略号を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製造年月日又は略号

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 製品ごとに押印する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎



原本と相違ありません。

出中コンクリート工業(株) 横浜工場



3. 配合計画書

コンクリートの圧縮強度 設計基準強度は $\sigma_{14}=30\text{N/mm}^2$ とする。製造方式(流し込み)

コンクリートの配合

セメントの種類	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプの範囲(cm)	空気量 (%)	水セメント比W/C (%)	細骨材率S/a(%)	単位量(kg/m ³)					
						水W	セメントC	細骨材S	粗骨材G	混和剤AE	空気量調整剤
普通	20	7.0±2.0	5.0±1.5	44.5	45.5	162	364	805	969	1.82	6A以下

※コンクリート中の塩化物総量は、 0.3kg/m^3 (Cl^-)以下
測定器 ソルメイト—100型(コ塩測第860701号)とする。

使用材料品質特性

セメント	項目	比表面積 (cm ² /g)	凝結		圧縮強度(N/mm ²)				化学成分(%)				
			始発 (h-m)	終結 (h-m)	安定性	3d	7d	28d	酸化マグネシウム	三酸化硫黄	強熱減量	全アルカリ	酸化物イオン
	種類												
	普通ポルトランド	2500以上	60m以上	10h以下	良	12.5以上	22.5以上	42.5以上	5.0以下	3.5以下	5.0以下	0.75以下	0.035以下
メーカー:UBE三菱セメント株式会社 岩手工場													

骨材	寸法			ふるいを通るものの質量百分率(%)										粗粒率 F. M			
	種類		25	20	15	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15					
	粒度	細	砕砂	—	—	—	100	90～100	80～100	50～90	25～65	10～35	2～15	2.90±0.15			
		粗	2005	100	90～100	—	20～55	0～10	0～5	—	—	—	—	6.80±0.20			
	品質	項目		絶対密度 (g/cm³)		吸水率 (%)		単位容積質量 (kg/2)		粒形判定実績率 (%)		微粒分量 (%)		安定性 (%)		すりへり減量 (%)	
		種類															
		細	砕砂	2.5以上		3.0以下		1.50以上		54以上		3.0±2.0		10以下		—	
		粗	2005	2.5以上		3.0以下		1.50以上		56以上		1.0±1.0		12以下		40以下	
	産地:細骨材(東成瀬村岩井川産) 粗骨材(東成瀬村岩井川産)																


※骨材は無害な骨材、又はアルカリ総量で 3.0kg/m^3 以下

鉄線	コンクリート用 鉄線 SWM-P JIS G 3532	線 径(mm)	2.60		3.20		4.00		5.00		6.00	
		許 容 差(mm)	±0.06		±0.08			±0.10				
		引張強さ(N/mm ²)	540以上									
		メーカー:北東金属株式会社 岩手県花巻市材木町 4 - 1										

鉄筋 コンクリート用棒鋼	項目	呼び名	許容差 (mm)	隆伏点 (N/mm ²)	引張り強さ (N/mm ²)	伸び (%)	曲げ試験
	種類	(mm)					
	熱間圧延 異形棒鋼	D6	JIS G 3112	295以上	440～600	16以上 (2号試験片)	曲げ角度180° 常温で曲げて、外側 に亀裂を生じてはならない。
		D10	に適合する				
	SD295	D13	こと				
	JIS G 3112	D16					
		D19					
メーカー:合同製鐵株式会社 大阪製造所 株式会社伊藤製鐵所 石巻工場							

混和剤	種類	品名	外観	比重	減水率(%)	ブリージング量の比
	AE減水剤標準形Ⅰ種	ヤマソー90SE	暗褐色液体	1.16~1.20	10以上	70以下
	製造元:山宗化学株式会社					

田中コンクリート工業株式会社 横手工場



アルカリ骨材反応抑制対策について

アルカリ骨材反応抑制対策では、次の3つの対策のうち、いずれか1つについてご確認いただくことになっております。

1. コンクリート中のアルカリ総量の抑制
2. 抑制効果のある混合セメントなどの使用
3. 安全と認められる骨材の使用

また、コンクリート工場製品の場合は、上記第1項～第3項の対策のうち、どの対策によって管理しているか、当工場からご報告しなければならないことになっております。このことにより、以下に当工場での対策をご報告いたします。

当工場では、上記第1項の「コンクリート中のアルカリ総量の抑制」により対策を講じています。

アルカリ総量の計算（R8. 7月分）

アルカリ総量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート1 m³に含まれるアルカリ総量をNa₂O換算で3.0kg以下にする。

$$\text{アルカリ総量} = \frac{\text{Na}_2\text{Oeq}}{100} \times C + 0.53 \times \frac{\text{NaCl-}}{100} \times A + \text{ADNa}_2\text{O}$$

ここに、Na₂Oeq：試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近6か月の最大の値(%) = 0.59

C：単位セメント量 = 364

NaCl-：骨材中塩化物量(%) = 0.000（砕砂は規定がないので0）

A：当該単位骨材量(kg/m³) = 1774

ADNa₂O：混和剤中のアルカリ量(kg/m³) = RA / 100 × WA = 0.07

混和剤中の含有量(%) RA = 3.6

単位混和剤量 WA = 1.820

$$\text{アルカリ総量} = \frac{0.59}{100} \times 364 + 0.53 \times \frac{0.000}{100} \times 1774 + 0.07 = 2.22 \leq 3.0 \text{ kg/m}^3$$

田中コンクリート工業（株）横手工場




4. 原材料品質証明

セメント試験成績表

2026 年 7 月度

UBE三菱セメント株式会社



種 類 品 質		普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高 炉 セ メ ン ト B 種 JIS R 5211					
		J I S 規定値	試 験 成 績			J I S 規定値	試 験 成 績			J I S 規定値	試 験 成 績				
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		
密 度 g/cm³		—	3.16	✓	—	—	3.14	—	—	—	3.04	—	—		
比表面積 cm²/g		2500以上	3230	✓	77	✓	—	3300以上	4610	80	—	3000以上	4030	87	—
凝 結	水 量 %	—	28.5	—	—	—	30.3	—	—	—	30.5	—	—		
	始 発 h-min	60min以上	2-24	✓	—	(1-35)	45min以上	1-41	—	(1-15)	60min以上	2-52	—	(2-30)	
	終 結 h-min	10h以下	3-30	✓	—	4-15	10h以下	2-32	—	3-00	10h以下	4-06	—	5-35	
安定性		バット法	良	良	✓	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強さ N/mm²	1 d	—	—	—	—	—	10.0以上	27.2	1.54	—	—	—	—	—	
	3 d	12.5以上	30.7	✓	1.53	✓	—	20.0以上	48.3	1.70	—	10.0以上	22.2	1.47	—
	7 d	22.5以上	46.1	✓	1.76	✓	—	32.5以上	60.0	1.82	—	17.5以上	34.8	1.74	—
	28 d	42.5以上	63.3	✓	1.88	✓	—	47.5以上	68.6	1.95	—	42.5以上	62.3	1.89	—
水和熱 J/g		7 d	—	327	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		28 d	—	383	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
化学成分 %		酸化マグ ネシウム	5.0以下	1.27	✓	—	2.26	5.0以下	1.01	—	1.13	6.0以下	3.23	—	3.49
		三酸化 硫 黄	3.5以下	2.40	✓	—	2.60	3.5以下	2.89	—	3.02	4.0以下	2.01	—	2.20
		全 アルカリ	0.75以下	0.47	✓	—	0.59	0.75以下	0.46	—	0.55	—	—	—	—
		塩化物 イオン	0.035以下	0.021	✓	—	0.030	0.02以下	0.011	—	0.020	—	0.012	—	—

- 備 考 ○ 全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値 ○ 高炉セメント B種
- ・普通ポルトランドセメント…………… 0.59% ✓
 - ・早強ポルトランドセメント…………… 0.62%
 - ・ベースセメントの全アルカリ…………… 0.47%
 - ・高炉スラグの分量…………… 40~45%
- 強熱減量(参考値)
- ・普通ポルトランドセメント…………… 平均値 2.57% (最大値 2.88%) ✓
 - ・早強ポルトランドセメント…………… 平均値 1.15% (最大値 1.51%)
 - ・高炉セメント B種 ……………… 平均値 1.58% (最大値 1.80%)
1. 試験方法は JIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203、JIS R 5204 による。
2. 28d圧縮強さおよび28d水和熱は前月度の値を示す。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 構手工場

◎ お問い合わせその他のご連絡先

〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-25

JRE東二番丁スクエア12F

UBE三菱セメント株式会社

東北支店

TEL 022-711-5714



6/29

2026 年 7 月 度 粗 骨 材 試 験 成 績 表

試験日 1 日		試験日 3 日		試験日 6 日				
密度・吸水率試験 JIS A 1110		単位容積質量及び実績率試験 JIS A 1104		粒形判定実績率試験 JIS A 5005				
測定番号	1	2	測定番号	1	2			
① 表乾状態の試料の質量 (g)	2428.3	2297.3	① マスの容積 (L)	10.029	10.029			
② 水中のかごと試料の質量 (g)	1903.7	1821.7	② マスの質量 (kg)	3.502	3.502			
③ 水中のかごの質量 (g)	396.0	396.0	③ 試料+マスの質量	18.886	18.922			
④ 水の密度 (g/cm ³)	0.9982	0.9982	④ 単位容積質量 (③-②)/①	1.534	1.538			
⑤ 表乾密度 (①×④)/(①-②+③)	2.633	2.631	⑤ 平均値 (kg/L)	1.54				
⑥ 平均値 (g/cm ³)	2.63		平均値からの差 (0.01 kg/L 以下)	0.006	0.002			
⑦ 乾燥後の試料の質量 (g)	2390.5	2262.4	⑥ 実績率 ④/絶対密度×100	59.23	59.38			
⑧ 絶対密度 (⑦×④)/(①-②+③)	2.592	2.591	⑦ 平均値 (%)	59.3				
⑨ 平均値 (g/cm ³)	2.59		合否判定 実績率 56 % 以上	合	否			
平均値からの差 (0.01 g/cm ³ 以下)	0.002	0.001	ふるい分け試験 JIS A 1102					
⑩ 吸水率 (①-⑦)/⑦×100	1.581	1.543	月日	7/2	7/9	7/16	7/23	7/31
⑪ 平均値 (%)	1.56		粗粒率	6.77	6.84	6.81	6.85	6.82
平均値からの差 (0.03 % 以下)	0.021	0.017	外部依頼試験					
表乾密度 2.64 ± 0.02 g/cm ³	合	否	試験項目	規格値	試験値			
絶対密度 2.5 g/cm ³ 以上	合	否	すりへり減量	40 % 以下	12.5			
吸水率 3 % 以下	合	否	安定性試験	12 % 以下	1.0			
合 否 判 定			アルカリシリカ反応性試験		A			

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

2026 年 7 月 度 細 骨 材 試 験 成 績 表

骨材の産地	東成瀬村岩井川産	工場長	佐藤	QCM	試験係
骨材の種類	砕 砂				高橋

試験日 9 日

試験日 13 日

試験日 15 日

密度・吸水率試験 JIS A 1109		測定番号	1	2
①	水で満たしたピクノメータの全質量 (g)		675.0	703.0
②	表乾密度試験用試料の質量 (g)		500.0	500.0
③	試料と水で満たしたピクノメータの質量 (g)		984.8	1012.7
④	水の密度 (g/cm ³)		0.9982	0.9982
⑤	表乾密度 (2)×(4)/(1+2-3)		2.624	2.623
⑥	平均値 (g/cm ³)		2.62	
	平均値からの差 (0.01g/cm ³ 以下)		0.004	0.003
⑦	表乾状態の吸水率試験用試料の質量 (g)		500.0	500.0
⑧	乾燥後の吸水率試験用試料の質量 (g)		491.7	491.8
⑨	吸水率 (7-8)/8×100		1.688	1.667
⑩	平均値 (%)		1.68	
	平均値からの差 (0.05 %以下)		0.008	0.013
⑪	絶対乾密度 5×8/7		2.580	2.580
⑫	平均値 (g/cm ³)		2.58	
	平均値からの差 (0.01 g/cm ³ 以下)		0.000	0.000
合 否 判 定	表乾密度 2.63±0.02 g/cm ³		合	否
	吸水率 3 %以下		合	否
	絶対乾密度 2.5 g/cm ³ 以上		合	否

単位容積質量及び実績率試験 JIS A 1104		測定番号	1	2
①	マスの容積 (L)		2.019	2.019
②	マスの質量 (kg)		1.046	1.046
③	試料+マスの質量		4.260	4.266
④	単位容積質量 (3-2)/1		1.592	1.595
⑤	平均値 (kg/L)		1.59	
	平均値からの差 (0.01 kg/L以下)		0.002	0.005
⑥	実績率 4/絶対乾密度×100		61.71	61.82
⑦	平均値 (%)		61.8	
合 否 判 定	単位容積質量 1.50 kg/L以上		合	否
	実績率 54 %以上		合	否

ふるい分け試験 JIS A 1102		月日	7/2	7/9	7/16	7/23	7/31
	粗粒率		2.92	2.93	2.87	2.95	2.86

粒形判定実績率試験 JIS A 5005		① 単位容積質量 (kg/L)	1.55
	② 絶対乾密度 (g/cm ³)		2.58
	③ 粒形判定実績率 ①/②×100 (%)		60.1
合 否 判 定	実績率 54 %以上		合

試験日 17 日

外部依頼試験

微粒分量試験 JIS A 1103		測定番号	1	2
①	洗う前の試料の乾燥質量 (g)		500.0	500.0
②	洗った後の試料の乾燥質量 (g)		485.8	485.6
③	網ふるい0.075mmを通過する量の百分率 (1-2)/(1×100)		2.84	2.88
④	平均値 (%)		2.9	
	2回の測定値の差 (0.5 %以下)		0.04	
合 否 判 定	3.0±2.0 %		合	否

試験項目	規格値	試験値
安定性試験	10 %以下	1.0

アルカリシリカ反応性試験	A
--------------	---

原本と相違ありません。
関中コンクリート工業(株) 横手工場

粗骨材のふるい分け試験

8. 7. 月 分


QCM	試験係
佐藤	高橋

試験年月日： 2026 年 7 月 31 日

種 類	砕 石 2005
産 地	雄勝郡東成瀬村岩井川地内
最大寸法	20.0 (mm)
試料の採取場所	工場粗骨材（砕 石）ヤード
試料の採取日	2026 年 7 月 30 日
ふるい分け前の試料の質量	5061 (g)
ふるい分け方法	機 械

ふるいの呼び寸法 (mm)	30	25	20	15	10	5	2.5	>	合 計
連続する各ふるいの間に留まる質量 (g)		0	343	1465	2107	975	146	18	5054
連続する各ふるいの間に留まる質量分率 (%)		0	7	29	42	19	3	0	100
各ふるいに留まる質量分率 (%)		0	7	36	78	97	100	100	
各ふるいを通過する質量分率 (%)		100	93	64	22	3	0	0	
粒度範囲 (%)		100	90~100		20~55	0~10	0~5		

項 目	規 格 値	実 測 値	判 定
試料質量差	1%未満	0.1	合
粗粒率 (FM)	6.80±0.20	6.82	合

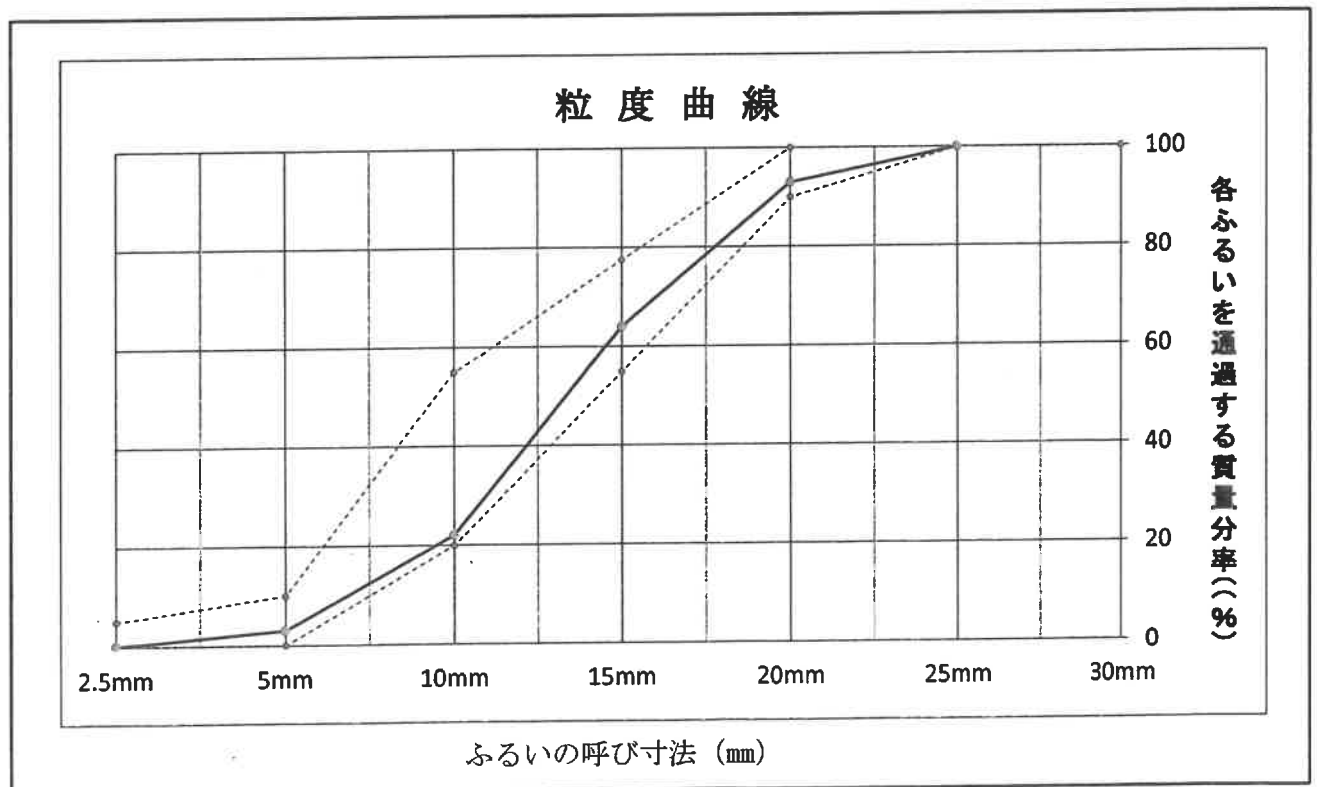

項 目	規 格 値	実 測 値	判 定
粒 度	粒度範囲のものでなければならない	粒度範囲内	合

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

過小粒率試験成績表

2026 年 7 月

QCM	係
佐藤	高橋

種 類	砕 石 2005
産 地	雄勝郡東成瀬村岩井川地内

試験実施日	2 日 (木)	試料の採集場所	工場粗骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	5,030 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	4,863 g	試料質量差			過小粒率		
5mmふるいを通過する量	161 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	5,024 g	1%未満	0.1	合	10%以下	3 %	合

試験実施日	9 日 (木)	試料の採集場所	工場粗骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	5,015 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	4,908 g	試料質量差			過小粒率		
5mmふるいを通過する量	102 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	5,010 g	1%未満	0.1	合	10%以下	2 %	合

試験実施日	16 日 (木)	試料の採集場所	工場粗骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	5,046 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	4,821 g	試料質量差			過小粒率		
5mmふるいを通過する量	221 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	5,042 g	1%未満	0.1	合	10%以下	4 %	合

試験実施日	23 日 (木)	試料の採集場所	工場粗骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	5,057 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	4,933 g	試料質量差			過小粒率		
5mmふるいを通過する量	113 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	5,046 g	1%未満	0.2	合	10%以下	2 %	合

試験実施日	31 日 (金)	試料の採集場所	工場粗骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	5,061 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	4,890 g	試料質量差			過小粒率		
5mmふるいを通過する量	164 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	5,054 g	1%未満	0.1	合	10%以下	2 %	合

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

細骨材のふるい分け試験


QCM	試験係
佐藤	高橋

試験年月日： 2026 年 7 月 31 日

種 類	砕 砂
産 地	雄勝郡東成瀬村岩井川地内
最大寸法	5.0 (mm)
試料の採取場所	工場細骨材(砕 砂)ヤード
試料の採取日	2026 年 7 月 29 日
ふるい分け前の試料の質量	528.0 (g)
ふるい分け方法	機 械

ふるいの呼び寸法 (mm)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	>	合 計
連続する各ふるいの間に留まる質量 (g)	0.0	0.0	47.4	120.7	167.9	105.4	68.3	15.1	524.8
連続する各ふるいの間に留まる質量分率 (%)	0	0	9	23	32	20	13	3	100
各ふるいに留まる質量分率 (%)	0	0	9	32	64	84	97	100	
各ふるいを通過する質量分率 (%)	100	100	91	68	36	16	3	0	
粒度範囲 (%)	100	90~100	80~100	50~90	25~65	10~35	2~15		

項 目	規 格 値	実 測 値	判 定
試料質量差	1%未満	0.6	合
粗粒率 (FM)	2.90 ± 0.15	2.86	合
連続する各ふるいの間に留まる質量分率 (%)	質量分率 < 45.0%	質量分率 < 45.0%	合

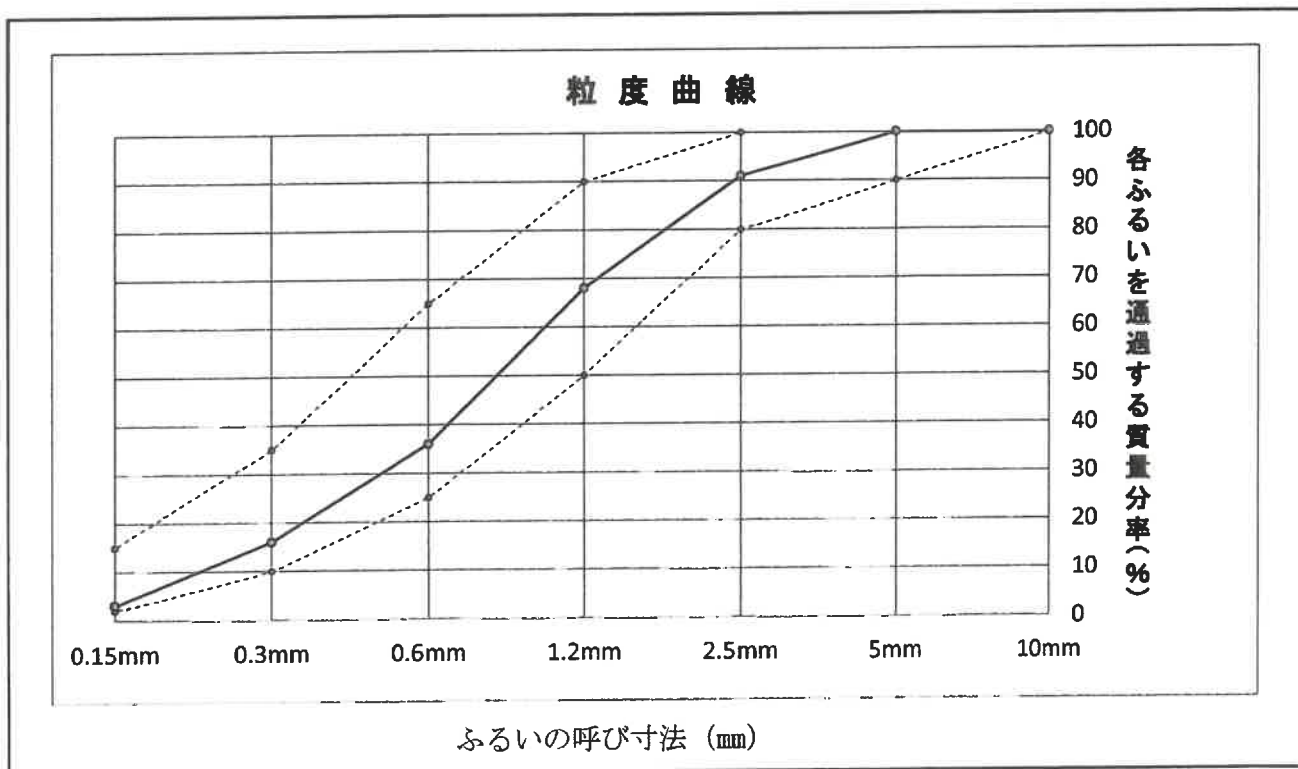

項 目	規 格 値	実 測 値	判 定
粒 度	粒度範囲のものでなければならない	粒度範囲内	合

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横浜工場

過大粒率試験成績表

2026 年 7 月

QCM	試験係
佐藤	高橋

種 類	砕 砂
産 地	雄勝郡東成瀬村岩井川地内

試験実施日	2 日 (木)	試料の採集場所	工場砕砂骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	548.9 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	0.0 g	試料質量差			過大粒率		
5mmふるいを通過する量	546.3 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	546.3 g	1%未満	0.5	合	5%以下	0 %	合

試験実施日	9 日 (木)	試料の採集場所	工場砕砂骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	523.6 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	0.0 g	試料質量差			過大粒率		
5mmふるいを通過する量	520.3 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	520.3 g	1%未満	0.6	合	5%以下	0 %	合

試験実施日	16 日 (木)	試料の採集場所	工場砕砂骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	517.7 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	0.0 g	試料質量差			過大粒率		
5mmふるいを通過する量	514.6 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	514.6 g	1%未満	0.6	合	5%以下	0 %	合

試験実施日	23 日 (木)	試料の採集場所	工場砕砂骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	542.2 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	0.0 g	試料質量差			過大粒率		
5mmふるいを通過する量	539.1 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	539.1 g	1%未満	0.6	合	5%以下	0 %	合

試験実施日	31 日 (金)	試料の採集場所	工場砕砂骨材ヤード	(備 考)			
試料の質量	528.0 g	ふるい分け方法	機 械				
5mmふるいにとどまる量	0.0 g	試料質量差			過大粒率		
5mmふるいを通過する量	524.8 g	規格値	実測値	判定	規格値	実測値	判定
合 計	524.8 g	1%未満	0.6	合	5%以下	0 %	合

本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

粗 骨 材 の 試 験 結 果 報 告 書

田中コンクリート工業株式会社 横手工場 御中

試験番号 25G15637-1/3頁

発行日 令和 7 年 8 月 8 日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村 敏彦



件 名		
顧 客 名 称		田中コンクリート工業株式会社 横手工場
顧 客 住 所		横手市平鹿町醍醐字沖野2-1
試 験 品 目	種 類 ※	砕 石
	産 地 ※	東成瀬村岩井川産
	採取場所※	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	採 取 者 ※	佐藤 清広
	採取月日※	令和 7 年 7 月 1 8 日
	そ の 他 ※	
	受入れ時の状態	宅配便・土嚢袋1袋（約25 kg）
受領年月日		令和 7 年 7 月 2 4 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試 験 結 果
すりへり減量 JIS A 1121:2022	すりへり減量 12.5 % ✓ ☆詳細は2頁のとおり
安 定 性 JIS A 1122:2014	1.0 % ✓ ☆詳細は3頁のとおり
備 考	
・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。	

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみに有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。



2/18

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



25G15637-2/3頁

試験規格		ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験表	
JIS A 1121 : 2022			
試験年月日		令和 7 年 8 月 5 日	
試験実施場所		技術研修センター 試験室・ロサンゼルス室	
試 料	No.	G-15637	
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 横手工場	
	種類	砕石	
	産地	東成瀬村岩井川産	
	採取月日	令和 7 年 7 月 18 日	
とどまるふるい	通るふるい	各群の質量分率	試験前の各群の質量
(mm)	(mm)	(%)	(g)
60	80		
50	60		
40	50		
25	40		
20	25	4	
15	20	23	
10	15	50	2502
5	10	20	2499
2.5	5	2	
—	2.5	1	
合 計		100	5001
試験前の試料の質量 : m_1		(g)	5001
粒度区分			H
球の数		(個)	10
球の全質量		(g)	4169
試験後1.7 mmふるいに残った質量 : m_2		(g)	4377
すりへり減量 : R		(%)	12.5
備 考			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

試験規格		硫酸ナトリウムによる粗骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014						
試験年月日		令和 7 年 8 月 1 日 ~ 8 月 6 日				
試験実施場所		技術研修センター 試験室				
試 料	No.	G-15637				
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 横手工場				
	種類	砕石				
	産地	東成瀬村岩井川産				
	採取月日	令和 7 年 7 月 18 日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
5	10	21	301	296	1.7	0.4
10	15	52	503	498	1.0	0.5
15	20	23	753	750	0.4	0.1
20	25	4			0.4	0.0
25	40					
合 計		100				1.0

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



細 骨 材 の 試 験 結 果 報 告 書

田中コンクリート工業株式会社 横手工場 御中

試験番号 25S15755-1/2頁

発行日 令和 7 年 12 月 23 日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-3009

承認署名者・所長 木村 敏彦



件 名		
顧 客 名 称		田中コンクリート工業株式会社 横手工場
顧 客 住 所		横手市平鹿町醍醐字沖野2-1
試 験 品 目	種 類 ※	砕 砂
	産 地 ※	東成瀬村岩井川産
	採取場所※	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	採 取 者 ※	藤 原
	採取月日※	令和 7 年11月26日
	そ の 他 ※	
	受入れ時の状態	宅配便・土嚢袋1袋（約25 kg）
	受領年月日	令和 7 年12月 4 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試 験 結 果
安 定 性	1.0 % ✓
JIS A 1122:2014	☆詳細は2頁のとおり
備 考	
・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。	

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみに有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。



12/25

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



試験規格		硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014						
試験年月日		令和 7 年12月15日 ～12月20日				
試験実施場所		技術研修センター 試験室・恒温室				
試 料	No.	S-15755				
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 横手工場				
	種類	砕 砂				
	産 地	東成瀬村岩井川産				
	採取月日	令和 7 年11月26日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
—	0.075	2	—	—	—	—
0.075	0.15	10	—	—	—	—
0.15	0.3	16	—	—	—	—
0.3	0.6	23	100.0	98.1	1.9	0.4
0.6	1.2	25	100.0	98.5	1.5	0.4
1.2	2.5	20	100.0	98.8	1.2	0.2
2.5	5	4			1.2	0.0
5	10					
合 計		100				1.0 ✓

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



令和 8 年 4 月 10 日

田中コンクリート工業株式会社 様

当社で納入している【砕砂】は、同じく納入しているコンクリート用砕石 2005 と同じ原石採取地であることを証明致します。

従って、J I S A 1145:2022 アルカリシリカ反応性により、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センター 令和 8 年 4 月 10 日発行の試験結果報告書（試験番号 26C5985-1）、骨材のアルカリシリカ反応性試験結果を御使用下さいますようお願い致します。

採取地 : 雄勝郡東成瀬村岩井川字土倉59番地

雄勝郡東成瀬村岩井川字合居川国有林

1004林班へり.と1小班

秋田県横手市黒川字川南149

合居砕石株式会社

代表取締役 宗久治雄



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場





骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

8. 7. 月分

合居砕石株式会社 御中

試験番号 26C5985-1/1頁
発行日 令和 8 年 4 月 10 日
〒011-0904 秋田市 寺内蛭根 15-18
秋田県生コンクリート工業組合技術研修センター
TEL 018-824-5540, 018-823-8294
承認署名者・所長

試験品目	件名	
	顧客名称	合居砕石株式会社
	顧客住所	横手市黒川字川南149
	種類※	砕石 2005
	産地※	雄勝郡東成瀬村岩井川字土倉59番地 雄勝郡東成瀬村岩井川字合居川国有林1004林班へ・り・と1小班
	採取場所※	雄勝郡東成瀬村岩井川字野尻9-21
	採取者※	佐々木 謙吉
	採取月日※	令和 8 年 4 月 1 日
	製造業者※	合居砕石株式会社
	その他※ (採取立会者)	鰐湯沢生コン増田工場, 鰐湯沢生コン, (田中コンクリート工業鰐横手工場)佐藤 清広, (秋南アサノコンクリート)佐々木 光司, 秋田カイハツ生コンクリート鰐由利工場, 秋田カイハツ生コンクリート鰐象潟工場, 鳥海プラント
	受入れ時の状態	宅配便・土嚢袋 2 袋 (約50 kg)
	受領年月日	令和 8 年 4 月 2 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

上記試験品目の試験結果は、上記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和 8 年 4 月 7 日 ~ 4 月 8 日				
試験実施場所	技術研修センター計量室				
試験方法	JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。				
試験項目	試験結果 (mmol/L)				判定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	78	74	77	76	無 害 ✓
溶解シリカ量 (Sc)	32	31	32	32	
判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。 この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。					

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてののみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは

完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。



4/15

以上

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場


原本と相違ないことを証明します

令和 8 年 4 月

秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合

技術研修センター



2026年7月 ～ 2026年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

田中コンクリート工業(株)
横手工場

御中

種 類 AE減水剤 標準形 I種
商品名 ヤマソー90SE

1. コンクリートの試験結果

項 目		JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減 水 率 %	10以上	15 ✓	15 ✓
	ブリーディング量の比 %	70以下	53 ✓	—
	ブリーディング量の差 cm ³ /cm ²	—	—	—
	凝結時間の差 分	始 発	+ 60 ✓	+ 70 ✓
		終 結	+ 70 ✓	+ 50 ✓
	経時変化量	スランプ cm	—	—
		空気量 %	—	—
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢 1日	—	—
		材齢 2日 (5℃)	—	—
		材齢 7日	129 ✓	129 ✓
		材齢28日	120 ✓	120 ✓
	長さ変化比 %	120以下	101 ✓	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60以上	92 ✓	—

注記1. 1m³当たりの化学混和剤の使用量形式評価試験 1.77 kg/m³ , 性能確認試験 1.77 kg/m³注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 5月
の試験結果である。ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している
試験値は、2025年 12月 の試験結果である。注記3. この表に表示している形式評価試験は、2026年 5月 に 山宗化学株式会社
で実施した試験結果である。2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204に よる規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の 含有量	1m ³ 当たりの化学 混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン (Cl ⁻) 量	0.02 kg/m ³ 以下	0.00 kg/m ³	0.01 % ✓	1.77 kg/m ³	0.00 kg/m ³ ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m ³ 以下	0.06 kg/m ³	3.6 % ✓	1.77 kg/m ³	0.06 kg/m ³ ✓

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2026年 5月 に 山宗化学株式会社
で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密度 (g/cm ³ , 20℃)	1.16 ~ 1.20	1.18 ✓

注記 この表に表示している試験値は、2026年 5月 の試験結果である。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

6/30

水 質 試 験 結 果 報 告 書

田中コンクリート工業株式会社 横手工場 御中

試験番号 26水5085 - 1 / 3頁

発行日 令和 8 年 7 月 2 日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-4831

承認署名者・所長 木村 敏



件 名		
顧 客		田中コンクリート工業株式会社 横手工場
顧 客 住 所		横手市平鹿町醍醐字沖野2-1
試 験 品 目	種 類 ※	上水道水以外の水（地下水）
	採 取 場 所 ※	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	採 取 者 ※	藤原 昭夫
	採 取 月 日 ※	令和 8 年 6 月 1 日
	受入時の状態	宅配便・ペットボトル4 L
	受 領 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験方法	JIS A 5308 : 2026 附属書JC		
試験項目	試	験	結 果
懸濁物質の量	試験年月日	令和 8 年 6 月 3 日	
	試験実施場所	技術研修センター 計量室 0.0 g/L ✓	
溶解性蒸発残留物の量	試験年月日	令和 8 年 6 月 3 日	
	試験実施場所	技術研修センター 計量室 0.1 g/L ✓	
塩化物イオン (C l ⁻) 量			12.70 mg/L ✓
セメントの凝結時間の差	☆詳細は 2 頁のとおり		
	始発時間の差		0 分 ✓
	終結時間の差		0 分 ✓
	☆詳細は 3 頁のとおり		
モルタルの圧縮強さの比	材 齢 7 日	101 % ✓	
	材 齢 2 8 日	99 % ✓	
	☆詳細は 3 頁のとおり		
備考 基準水は精製水を使用した。			
・ 上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。			

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試験品目についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部分だけを複製しないで下さい。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



7/6

塩化物イオン (Cl ⁻) 量の試験表			
試験方法		塩化物イオン(Cl ⁻)量の試験(JIS A 5308:2026 附属書JC) (フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の 試験方法(電位差滴定法) (JIS A 1144:2010))	
試験年月日		令和 8 年 6 月 3 日	
試験実施場所		技術研修センター 計量室	
試料	No.	水-5085	
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 横手工場	
	種類	上水道水以外の水(地下水)	
測定番号		1	2
試料の量: V (mL)		100	100
試験滴定量: a (0.0282 mol/L-AgNO ₃) (mL)		1.2648	1.2799
0.0282 mol/L-AgNO ₃ のファクター: f		0.998	0.998
塩化物イオン (Cl ⁻) 量: C (mg/L)		12.623	12.773
平均値 (mg/L)		12.70	
備考 機種名: 電位差自動滴定装置 AT-710 (京都電子工業株式会社)			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター


 原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 横手工場

セメントの凝結時間の差の試験及びモルタルの圧縮強さの比の試験表			
試 料	No.	基 準 水	水 - 5085
	工 場 名	_____	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	種 類	精 製 水	上水道水以外の水（地下水）
試 験 方 法		セメントの凝結時間の差の試験 (JIS A 5308 : 2026 附属書JC)	
試 験 実 施 場 所		技術研修センター 恒温室	
試 験 年 月 日		令和 8 年 6 月 3 日	
試 験 値	始発時間	135 分	135 分
	終結時間	195 分	195 分
	始発時間の差	_____	0 分
	終結時間の差	_____	0 分
試 験 方 法		モルタルの圧縮強さの比の試験（B法） (JIS A 5308 : 2026 附属書JC)	
試 験 実 施 場 所		技術研修センター 恒温室・試験室	
供 試 体 製 作 月 日		令和 8 年 6 月 3 日	
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ 試 験 日		令和 8 年 6 月 10 日	
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ (N/mm ²)		40.8	41.1
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ の 比		_____	101 %
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ 試 験 日		令和 8 年 7 月 1 日	
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ (N/mm ²)		57.0	56.7
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ の 比		_____	99 %
備考			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
以上

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



8. 7. 月分

コンクリート用鉄線試験検査証明書

2026年 7月24日 発行

秋田新産線材株式会社 御中

北東金属株式会社

岩手県花巻市材木町4番1号

TEL 0198-23-3261

FAX 0198-23-3264

規格番号 JIS G3532 ✓

認証番号 TC0208105

検査係



製造No.	標準線径 (mm)	測定値 (mm)	最大引張荷重 (N)	引張強さ (N/mm ²)	絞 り (%)	曲げ性
40710A	6.00	5.98 ✓	16600	591 ✓	64 ✓	GOOD ✓
40530B	5.50	5.50 ✓	16200	684 ✓	58 ✓	GOOD ✓
90710A	5.00	5.00 ✓	12250	625 ✓	61 ✓	GOOD ✓
50706B	4.00	4.00 ✓	8800	698 ✓	59 ✓	GOOD ✓
10624A	3.20	3.17 ✓	5640	715 ✓	58 ✓	GOOD ✓
30205A	2.60	2.58 ✓	4120	788 ✓	51 ✓	GOOD ✓
コンクリート用鉄線 (SWM-P)						
線 径(mm)	許容差(mm)		引張強さ(N/mm ²)		絞り (%)	
2.60・2.90	±0.06		540 以上		30 以上	
3.20・3.50・4.00	±0.08		"		"	
4.50・5.00	±0.10		"		"	
5.50・6.00	±0.10		"		"	
6.00 を超えるもの	±0.13		"		"	

上記注文品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



8/8

Contract No. 注文 No.: 07747656130
Order's No. 注文組合番号: 6AGQH55 21Z
Supplier 株式会社メタルワン
Commodity 品名: 異形棒鋼 (バーインコイル)
Specification 規格: JIS G 3112 SD295
Customer 需要家: 北東金属株式会社
Shipper 船主:
Destination 港:
工事名称:

INSPECTION CERTIFICATE
鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社大阪製造所
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Certificate No. 証明書番号 : 1020260602106
Date 発行日 : 2026/06/21
処理コード : 0621 60161

Ship No. 船番:

Size 寸法	Length 長さ	Quantity 員数	Mass 質量 kg	Charge No. 鋼番	Chemical Composition 化学成分					Tensile Test 引張試験	Test Pieces: JIS 2 JIS 2号試験片			Bend Test JIS 2号試験片 曲げ試験
					C %X100 Max. 27	Si %X100 Max. 55	Mn %X100 Max. 150	P %X100 Max. 50	S %X1000 Max. 50		Y.P. 降伏点 又は0.2%耐力 N/mm2 Min. 295	T.S. 引張強さ N/mm2 440 - 600	EL. 伸び % Min. 16	曲げ性 R 1.5D Angle 180°
D6 ✓ D6 ✓		5 7	5,071 7,095	513430 513431	16 ✓ 15 ✓	17 ✓ 17 ✓	65 ✓ 66 ✓	24 ✓ 26 ✓	19 ✓ 18 ✓		354 ✓ 344 ✓	517 ✓ 501 ✓	30 ✓ 32 ✓	GOOD ✓ GOOD ✓
合計		12	12,166											
Size 寸法	Charge No. 鋼番	Coil No. コイル番号												
D6 ✓ D6 ✓	513430 513431	007 008 009 107 108 041 042 043 048 140 146 148												

原本と相違ありません。
中コンクリート工業(株) 橋手工場



Head of Quality Control Department
品質管理室長

橋手 大輔
Hatsuke Mochihiro

We hereby certify that the material described herein has been made in accordance with the rules of the contract.
上記注文書に添付の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

Signed for

8. 7. 月分

製品検査証明書

onicon



株式会社伊藤製鋼所
本社 東京都千代田区神田小川町一丁目
TEL. 03 (3623) 1111
筑波工場 茨城県つくば市片田486番地
TEL. 029 (837) 2111
*石巻工場 宮城県石巻市重吉町2番地
TEL. 0225 (96) 1111

契約番号 26601105-2

商社 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱

特約店 メークス (株)

需要家 メークス (株)

工事名 秋田新産線材 (株) 7~9月

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規格 JIS G 3112 ✓

種類 SD295 ✓

総質量 17,925 kg

7564I-02

証明書番号 51293418

発行日 26.07.21

溶鋼番号	呼び名	長さ m	本数	質量 kg	小計 kg	納入明細				機械的性質				化学成分			
						試験 片(号)	降伏点 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	降伏比 %	曲げ試験 角度180度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	%
1937	D10 ✓	5.500	720	2,218		2	368	492	26	✓	GOOD ✓	18	14	59	28	27	✓
1932	D10 ✓	6.000	1,800	6,048		2	372	504	27	✓	GOOD ✓	19	15	62	27	24	✓
1934	D10 ✓	6.000	1,080	3,629	11,895	2	376	496	26	✓	GOOD ✓	18	16	63	28	29	✓
1860	D13 ✓	7.000	240	1,670	1,670	2	350	491	26	✓	GOOD ✓	19	17	66	26	24	✓
1835	D16 ✓	7.000	200	2,180		2	343	486	26	✓	GOOD ✓	18	15	59	33	30	✓
7774	D16 ✓	7.000	200	2,180	4,360	2	346	492	25	✓	GOOD ✓	19	18	64	28	30	✓

上記注文品はご指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。



8/18



相建ありません。
中コンクリート工業(株) 横手工場

5. コンクリート試験管理表


製品同一養生圧縮強度管理図(̄X-R管理図・ヒストグラム)

2026 年 7 月分


製品同一養生圧縮強度管理図(X-R管理図・ヒストグラム)																										
2026 年 7月分																										
品質管理		QCM																				試験係				
品質管理		佐藤																				高橋				
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
日付																										
測 定 値	X1	39.7	34.6	37.5	38.5	34.8	36.4	36.3	35.3	37.6	37.3	36.4	36.3	35.7	36.4	36.9	34.5	37.7	37.3	33.2	38.5	38.7				
	X2	36.4	35.4	36.7	34.4	38.5	37.7	33.8	35.4	38.5	38.5	36.6	33.4	38.7	37.8	39.5	33.6	35.3	35.3	37.6	35.2	36.4	39.4			
	X3	35.3	37.2	33.5	35.5	36.4	32.5	34.8	36.6	35.9	35.4	35.2	34.8	34.4	38.6	38.7	35.4	31.3	36.4	34.4	35.3	36.3	36.4			
	X	36.5	37.4	34.9	35.8	36.8	35.3	35.6	35.5	37.2	36.4	34.9	36.5	37.4	38.2	35.3	33.7	36.5	36.4	34.6	37.1	38.2				
R	2.4	4.3	3.2	3.1	3.1	6.0	2.9	2.8	0.6	3.1	2.1	3.0	4.3	2.9	3.1	3.3	4.0	2.4	3.2	2.1	2.2	3.0				
X̄-X	0.3	1.2	-1.3	-0.4	0.6	-0.9	0.1	-0.6	-0.7	1.0	0.2	-1.3	0.3	1.2	2.0	-0.9	-2.5	0.3	0.2	-1.8	0.9	2.0				
(X̄-X)²	0.09	1.44	1.69	0.16	0.36	0.81	0.01	0.36	0.49	1.00	0.04	1.69	0.09	1.44	4.00	0.81	6.25	0.09	0.04	2.56	0.81	4.00				
判定	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合				

製品名称	φ10×20単試体
品質特性	圧縮強度試験
養生方法	製品同一養生
材料	14日
設計強度	30N/mm²
配合強度	36.0N/mm²
最大値	38.2
最小値	33.7
n	3
D ₄	2.575
A ₂	1.893
A ₃	1.023
ΣX	796.5
ΣR	67.1
Σ(X̄-X)²	28.23
N	22


̄X 管理図

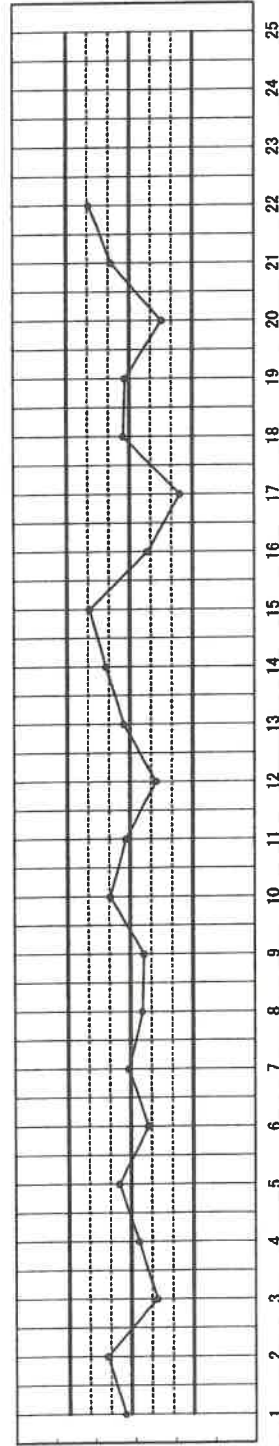

R 管理図

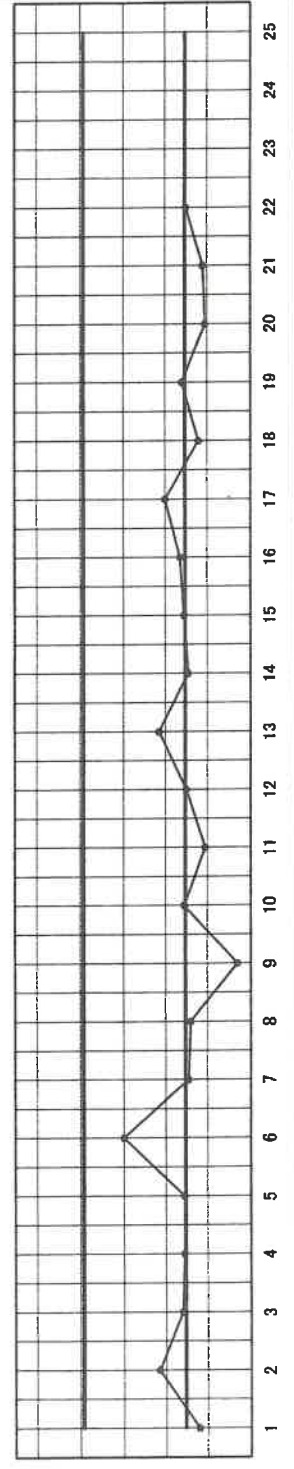

̄X ヒストグラム

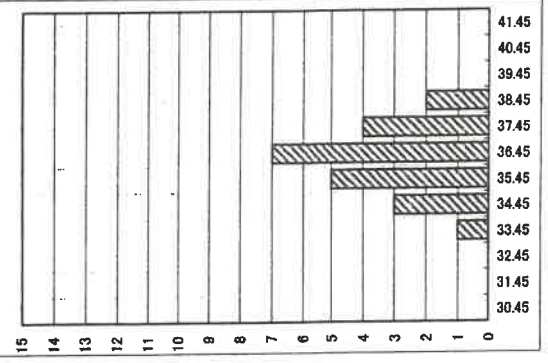

1. 平均強度(X) = $\Sigma \bar{X} / N$ = 36.2
2. 差の平均(R) = $\Sigma R / N$ = 3.05
3. Xの標準偏差(σ̄X) = $\sqrt{\Sigma (\bar{X} - \bar{X})^2 / (N-1)}$ = 1.16
4. 日内の標準偏差(σW) = $\sqrt{\Sigma R^2 / (N-1)}$ = 1.80
5. 日間の標準偏差(Σβ) = $\sqrt{\Sigma (\sigma W)^2 / 3}$ = 0.51
6. 全体の標準偏差(σ) = $\sqrt{\sigma W^2 + \sigma B^2}$ = 1.87
7. 変動係数(V) = $\sigma / \bar{X} \times 100$ = 5.17
8. ̄X 管理限界線(UCL) = $\bar{X} + A_2 \bar{R}$ = 39.3
8. ̄X 管理限界線(LCL) = $\bar{X} - A_2 \bar{R}$ = 33.1
9. R 管理限界線(UCL) = $D_4 \bar{R}$ = 7.9

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場


スランプ X 管理図【普通】

2026 年 7 月分

検査員	試験係
佐藤	高橋

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
測定時刻	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM
スランプ	8.0	6.5	6.0	6.5	7.0	8.0	7.5	7.0	6.5	7.5	8.0	7.0	6.5	7.0	7.5	8.0	7.0	6.5	7.0	7.5	8.0	7.0	6.5	7.0	7.5


Gmax20mm スランプ (単位 cm)

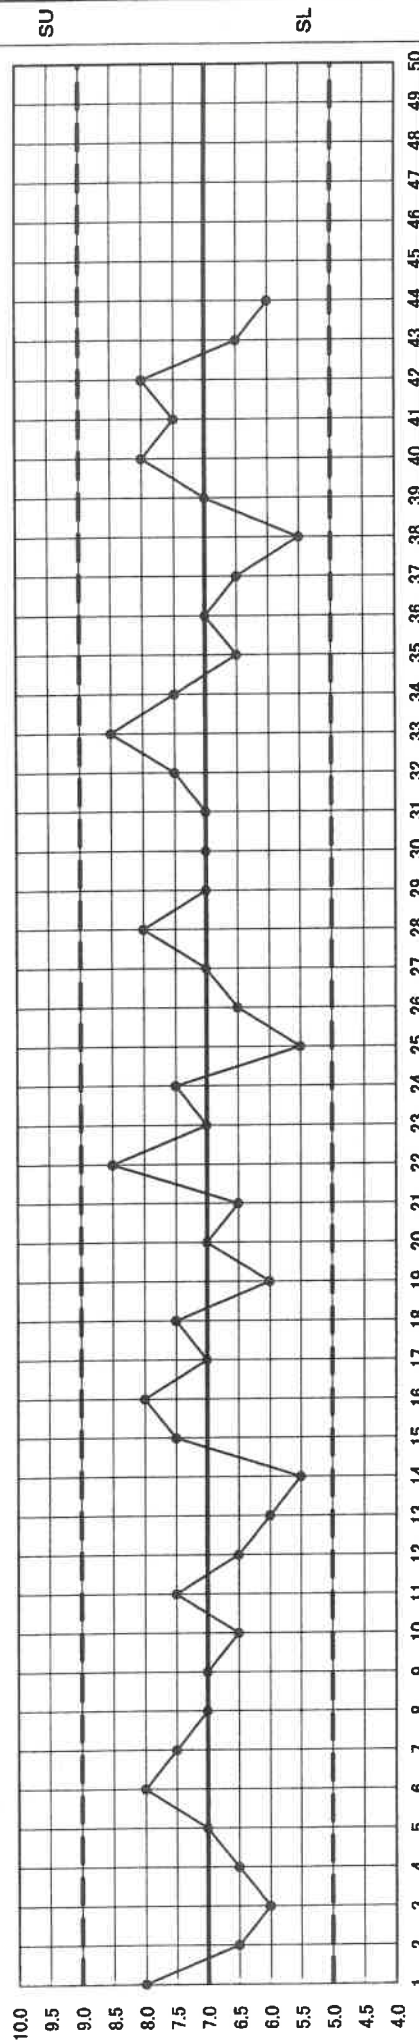

規格値	7.0±2.0cm
ロットサイズN	22
サンプルサイズn	44
最大値	8.5
最小値	5.5
区間の幅h	0.5
0番区間の中心値X0	7.0
Σf	44
Σfu	0
Σfu²	102

- ・ 平均値(X) $X = X_0 + \Sigma fu / \Sigma f \times h$ = 7.00
- ・ 標準偏差(S) $S = h \times \sqrt{1 / \Sigma f - 1 \{ \Sigma fu^2 - (\Sigma fu)^2 / \Sigma f \}}$ = 0.77
- ・ 工程能力指数(Cp) $Cp = SU - SL / 6 \times S$ = 0.87
- ・ 不良の割合
上限規格から外れる割合 $u = SU - X / S$ = 2.60 (K%)
下限規格から外れる割合 $u = X - SL / S$ = 0.47 (%)
全体の不良の割合 $P = PU + PL$ = 0.94 (%)

ヒストグラム

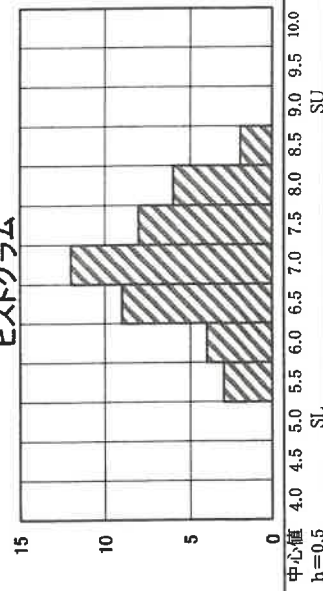

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
スランプ幅	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
f	0	0	0	3	4	9	12	8	6	2	0	0	0
u	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
fu	0	0	0	-8	-9	-8	0	8	12	6	0	0	0
fu²	0	0	0	27	16	9	0	8	24	18	0	0	0

原本と相違ありません。
関中コンクリート工業(株) 横手工場


空気量 X 管理図【普通】

2026 年 7 月分




N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
測定時刻	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM
空気量	5.4	4.9	4.4	4.6	3.9	4.7	5.0	5.5	5.1	5.0	4.6	4.3	5.4	5.1	5.5	5.0	4.8	5.2	4.2	4.7	4.9	5.2	5.6	5.2	4.5

Gmax20mm 空気量 (単位 %)

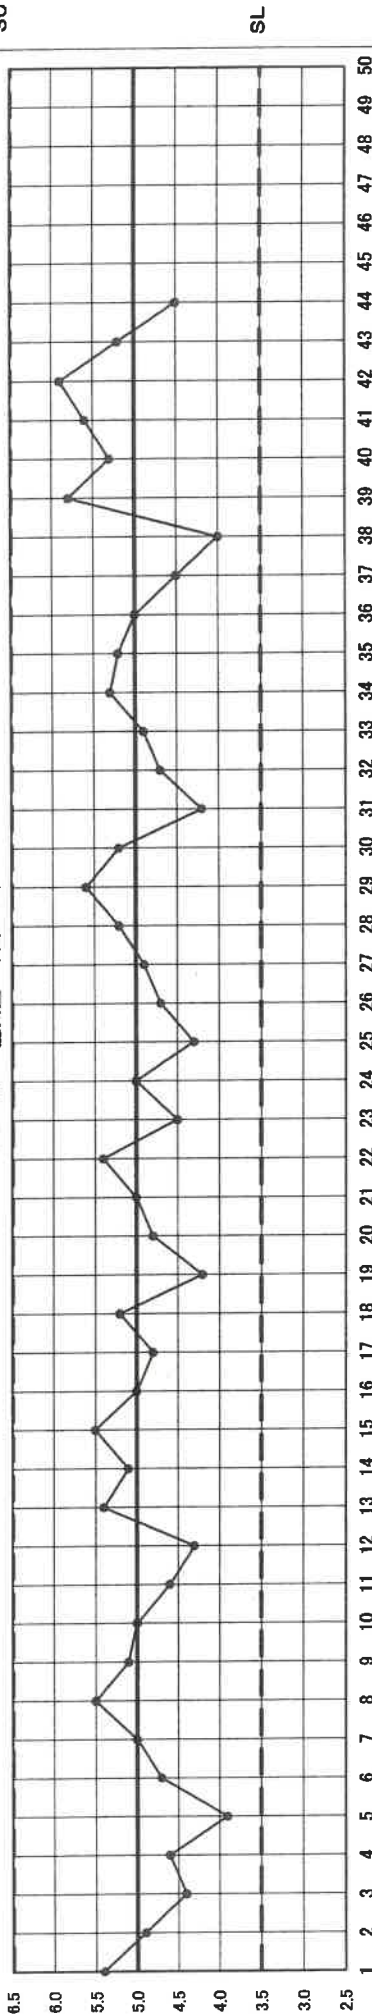

ヒストグラム

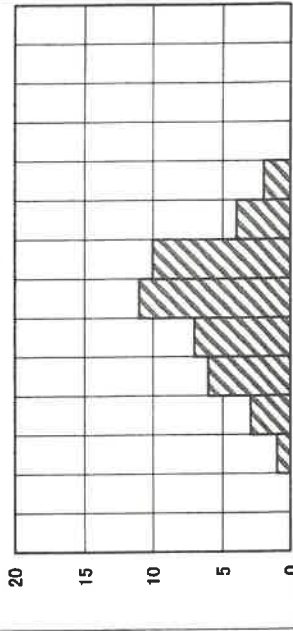

中心値 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8

h=0.3 SU

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
中心値	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8
f	0	0	1	3	6	7	11	10	4	2	0	0	0
u	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
fu	0	0	-4	-9	-12	-7	0	10	8	6	0	0	0
fu²	0	0	16	27	24	7	0	10	16	18	0	0	0

$$X = X0 + \Sigma fu / \Sigma f \times h = 4.95$$
$$S = h \times \sqrt{1 / \Sigma f - 1 \{ \Sigma fu^2 - (\Sigma fu)^2 / \Sigma f \}} = 0.49$$
$$Cp = SU - SL / 6 \times S = 1.01$$
$$u = SU - X / S = 3.15 (K \epsilon)$$
$$u = X - SL / S = 2.93 (K \epsilon)$$
$$P = PU + PL = 0.25 (\%)$$

規格値	5.0±1.5%
ロットサイズ N	22
サンプルサイズ n	44
最大値	5.9
最小値	3.9
区間の幅h	0.3
0番区間の中心値 X0	5.0
Σf	44
Σfu	-8
Σfu²	118

原本と相違ありません。
国中コンクリート工業(株) 横手工場

コンクリート中の塩化物総量測定記録										
測定年月日		令和 8 年 7 月 7 日		時刻 14 : 00		CT	℃	測定者	藤原	
示方配合表										
粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ の範囲 (cm)	空気量 の範囲 (%)	水セメ ント比 (%)	細骨材 率 (%)	単位量(kg/m3)					
					W	C	S	G	A d	
20	7.0±2.0	5.0±1.5	44.5	45.5	162	364	805	969	1.820	
セメントの種類		普通ポルトランドセメント			混和剤の種類		A E 減水剤標準形 I 種			
測定器名		ソルメイトー 100 型 コ塩測第 860701 号								
試料No	塩化物総量(kg/m3)				平均塩化物総量(kg/m3)					
1	26- 7-07 14:00 No: _____ W 162 Kg/m3 コンクリート C1 カンカン 1 ソウロウ 0.045Kg/m3 スイヨ-1# 0.029 %				26- 7-07 14:00 No: _____ W 162 Kg/m3 コンクリート C1 カンカン ハイチン n=3 ソウロウ 0.045Kg/m3 スイヨ-1# 0.029 %					
2	26- 7-07 14:00 No: _____ W 162 Kg/m3 コンクリート C1 カンカン 2 ソウロウ 0.047Kg/m3 スイヨ-1# 0.029 %				コンクリート中の塩化物総量 コンクリート中の塩化物総量は、測定値の平均とする。 1回目 0.045 kg/m3 2回目 0.047 kg/m3 3回目 0.044 kg/m3 平均 0.045. kg/m3 ≦ 0.30 kg/m3 合否判定 合格					
3	26- 7-07 14:00 No: _____ W 162 Kg/m3 コンクリート C1 カンカン 3 ソウロウ 0.044Kg/m3 スイヨ-1# 0.027 %									

工場長







6. 試驗機公正証明書

No. 8-3-50(1)

圧縮試験機校正前データ

田中コンクリート工業株式会社
横手工場 殿

2026年3月24日

校正温度 13.0℃

製造番号 1396

レンジ (目量) kN	試験力 (kN)	力計の 指示値 (kN)	測定実荷重		
			荷重増加 (kN)	器差 (%)	ゼロ戻り (%)
100kN (0.2)	20	20.002	20.159	-0.79	0.000
	40	40.001	40.206	-0.51	↑
	60	60.000	59.955	+0.08	
	80	80.001	79.851	+0.19	
	100	100.000	99.899	+0.10	
250kN (0.5)	50	50.001	50.256	-0.51	0.000
	100	100.001	100.374	-0.37	↑
	150	150.000	150.072	-0.05	
	200	199.999	199.987	+0.01	
	250	250.000	250.045	-0.02	
500kN (1)	100	100.000	99.990	+0.01	0.000
	200	200.002	200.510	-0.25	↑
	300	299.999	300.110	-0.04	
	400	399.638	399.818	-0.05	
	500	500.002	499.907	+0.02	
1000kN (2)	200	200.001	200.409	-0.20	0.000
	400	400.005	401.237	-0.31	↑
	600	600.000	600.600	-0.10	
	800	799.997	800.533	-0.07	
	1000	1000.003	1001.173	-0.12	

※ 検査最大許容値

相対指示誤差(±1%)

良 /

株式会社



計量士

竹田 和彦

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

3/30

曲げ試験機校正前データ

田中コンクリート工業株式会社
横手工場 殿

2026年3月24日

製造番号 1397

校正温度 13.0℃

レンジ (目量) kN	試験力 (kN)	力計の 指示値 (kN)	測定実荷重		
			荷重増加 (kN)	器差 (%)	ゼロ戻り (%)
50kN (0.1)	10	10.001	9.932	+0.69	0.000
	20	20.000	19.924	+0.38	↑
	30	30.002	29.779	+0.74	
	40	40.002	39.713	+0.72	
	50	50.002	49.761	+0.48	
100kN (0.2)	20	20.001	20.109	-0.54	0.000
	40	40.000	40.110	-0.28	↑
	60	59.999	60.042	-0.07	
	80	80.000	79.902	+0.12	
	100	100.000	99.986	+0.01	
200kN (0.4)	40	40.000	40.084	-0.21	0.000
	80	80.001	79.651	+0.44	↑
	120	120.002	119.505	+0.41	
	160	160.003	159.304	+0.44	
	200	200.007	198.857	+0.58	

※ 検査最大許容値 相対指示誤差(±1%) 良 ✓

株式会社 田中コンクリート工業株式会社
計量士 竹田 和彦

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

3/30

材料試験機校正証明書

田中コンクリート工業 株式会社
横手工場 殿

本報告書所載の材料試験機は、JIS B 7721に定める各規定によって
校正を行い、同規格に適合している事を証明します。

山形県酒田市
株式会社
計量士



名称及び型式：圧縮試験機 アムスラー式 油圧 堅型

レンジ：1000kN (500. 250. 100)

製造者：株式会社 谷藤製作所

製造番号：1 3 9 6

製造年月：昭和55年12月

設置場所：秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野2-1

田中コンクリート工業 株式会社 横手工場 内

校正年月日：自 2026年3月24日

有効期間：至 2027年3月23日

精度等級：

レンジ	等級	使用範囲の下限	レンジ	等級	使用範囲の下限
100kN	1	20kN	1000kN	1	200kN
250kN	1	50kN			
500kN	1	100kN			

荷重校正器：

型式	能力	器物番号	証明書番号	等級	校正年月日 有効期限
ロードセル	200kN	ADM180621	G240201	0.5	2024年12月11日 2026年12月10日
ロードセル	1000kN	ADM140297	G240202	1	2024年12月13日 2026年12月12日

- 上記器物の校正結果は別紙成績書通りである。
- 校正に用いた力計は、(社)日本計量振興協会校正センターにて
定期的に校正されているものを使用。
- 精度等級は、JIS B 7721 表2に基づいて行った。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



3/30

No. 8-3-51(2)

圧縮試験機成績書

2026年3月24日

製造番号 1396

校正温度 13.0℃

レンジ (目量) kN	測定回数	①		②	③	付属品 (有無) を含む 平均値	相対誤差(%)					拡張 不確 (%)
	力計位置	0度		120度	240度		指示	繰返	往復	零	分解能	
	ラム位置											
	最小レンジのみ	20%		40%	60%							
	試験力(kN)	増加	減少	増加	増加							
100 kN (0.2)	0	↓	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	20	20.16	19.87	20.06	20.08	20.10	-0.50	0.48	1.43	—	0.20	0.28
	40	40.21	39.69	40.05	40.06	40.08	-0.26	0.48	1.28	—	0.10	0.24
	60	59.95	59.28	59.85	59.86	59.87	0.19	0.20	1.13	—	0.07	0.13
	80	79.85	79.09	79.92	79.94	79.87	0.12	0.24	0.96	—	0.05	0.14
	100	99.90	↑	100.04	100.03	99.96	0.01	0.17	—	—	0.04	0.12
250 kN (0.5)	0	↓	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	50	50.26	—	50.06	50.09	50.14	-0.27	0.40	—	—	0.20	0.12
	100	100.37	—	100.33	100.34	100.35	-0.35	0.04	—	—	0.10	0.01
	150	150.07	—	150.13	150.15	150.12	-0.08	0.05	—	—	0.07	0.02
	200	199.99	—	200.16	200.19	200.11	-0.05	0.10	—	—	0.05	0.03
	250	250.04	—	250.31	250.20	250.19	-0.07	0.11	—	—	0.04	0.03
500 kN (1)	0	↓	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	100	99.99	—	100.04	99.95	99.99	0.01	0.09	—	—	0.20	0.44
	200	200.51	—	200.81	200.68	200.67	-0.33	0.15	—	—	0.10	0.43
	300	300.11	—	299.99	299.92	300.01	-0.00	0.06	—	—	0.07	0.42
	400	399.82	—	399.75	399.65	399.74	0.06	0.04	—	—	0.05	0.41
	500	499.91	—	500.24	500.10	500.08	-0.02	0.07	—	—	0.04	0.41
1000 kN (2)	0	↓	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	200	200.41	200.60	200.38	200.38	200.39	-0.20	0.01	-0.10	—	0.20	0.44
	400	401.24	399.92	400.99	401.01	401.08	-0.27	0.06	0.33	—	0.10	0.42
	600	600.60	598.93	599.62	599.89	600.04	-0.01	0.16	0.28	—	0.07	0.42
	800	800.53	797.77	801.11	801.14	800.93	-0.12	0.08	0.35	—	0.05	0.41
	1000	1001.17	↑	1001.34	1001.42	1001.31	-0.13	0.02	—	—	0.04	0.41

付属品の検証(無)

レンジ (kN)	試験力 (kN)	④ 増加	①:④ (%)
100 kN (0.2)	0	0.00	—
	20	20.10	0.3
	40	40.01	0.5
	60	59.84	0.2
	80	79.75	0.1
	100	99.87	0.0

1.検査最大許容値

2.最大荷重検査

3.安全装置の検査

4.感度検査

5.据え付け検査

6.加圧板 推奨値(0.01mm以内/100mm・HRC55以上) 別紙参照

7.球面座の構造・作動

q.相対指示誤差(±1%)
b.相対繰り返し誤差(1%)
v.相対往復誤差(±1.5%)
f₀.相対零誤差(±0.1%)
a.相対分解能(±0.5%)
荷重負荷装置
荷重指示装置
荷重に対する装置
稼働範囲に対する装置

良
良
良
良
良
良
良
良
良
良
良
良
良

株式会社



計量士 竹田 和彦



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

8. 7. 月分

No. 8-3-51(3)

加圧板成績書

2026年3月24日

製造番号 1396

検査員 竹田 貴典


I. 平面度

単位 (μm)

II. 硬度


単位 (HRC)

上 部

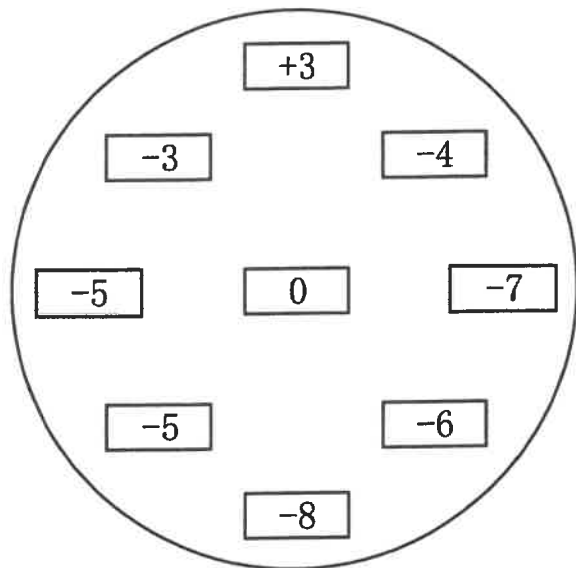

加圧板	硬度
上部	45
下部	47

下 部

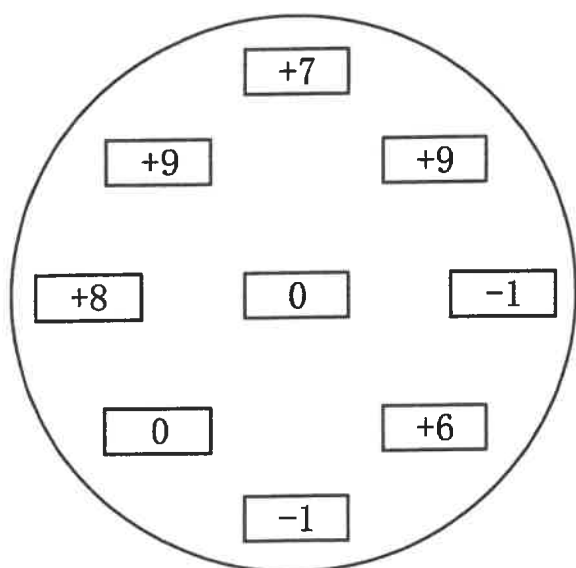 $\phi 10\text{cm}$ 用

備考: 本検査(上・下部 加圧板)に使用した測定器

1. ハードスコープ JT トーシ(株)

No.13295

2. 平面度検査器 (株)杉本試験機製作所

No.30818

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

材料試験機校正証明書

田中コンクリート工業 株式会社
横手工場 殿本報告書所載の材料試験機は、JIS B 7721に定める各規定によって
校正を行い、同規格に適合している事を証明します。山形県酒田市 18
株式会社 装
計量士 彦

名称及び型式：曲げ試験機 アムスラー式 油圧 堅型

レンジ：200kN (100 . 50)

製造者：株式会社 谷藤製作所

製造番号：1 3 9 7

製造年月：昭和55年12月

設置場所：秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野2-1

田中コンクリート工業 株式会社 横手工場 内

校正年月日：自 2026年3月24日

有効期間：至 2027年3月23日

レンジ	等級	使用範囲の下限	レンジ	等級	使用範囲の下限
50kN	1	10kN			
100kN	1	20kN			
200kN	1	40kN			

荷重校正器：

型式	能力	器物番号	証明書番号	等級	校正年月日 有効期限
ロードセル	200kN	ADM180621	G240201	0.5	2024年12月11日 2026年12月10日

- (1) 上記器物の校正結果は別紙成績書通りである。
(2) 校正に用いた力計は、(社)日本計量振興協会校正センターにて
定期的に校正されているものを使用。
(3) 精度等級は、JIS B 7721 表2に基づいて行った。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

3/30

曲げ試験機成績書

2026年3月24日

製造番号 1397

校正温度 13.0℃

レンジ (目量) kN	測定回数	①		②	③	付属品 (有無) を含む 平均値	相対誤差(%)					拡張 不確 (%)
	力計位置	0度		120度	240度		指示	繰返	往復	零	分解能	
	ラム位置											
	最小レンジのみ	20%		40%	60%							
	試験力(kN)	増加	減少	増加	増加							
50 kN (0.1)	0	↓	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	10	9.93	10.03	9.92	9.93	9.94	0.72	0.45	-1.03	—	0.20	0.28
	20	19.92	19.98	19.90	19.91	19.92	0.45	0.24	-0.29	—	0.10	0.15
	30	29.78	29.96	29.72	29.70	29.75	0.89	0.25	-0.60	—	0.07	0.16
	40	39.71	39.88	39.69	39.70	39.70	0.75	0.07	-0.41	—	0.05	0.09
	50	49.76	↑	49.73	49.74	49.72	0.51	0.24	—	—	0.04	0.14
100 kN (0.2)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	20	20.11	—	20.13	20.12	20.12	-0.60	0.10	—	—	0.20	0.19
	40	40.11	—	40.13	39.81	40.02	-0.04	0.79	—	—	0.10	0.53
	60	60.04	—	60.03	60.04	60.04	-0.06	0.01	—	—	0.07	0.10
	80	79.90	—	79.95	79.93	79.93	0.09	0.06	—	—	0.05	0.09
	100	99.99	—	99.92	99.96	99.96	0.04	0.06	—	—	0.04	0.09
200 kN (0.4)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	40	40.08	40.26	39.95	40.00	40.01	-0.02	0.34	-0.43	—	0.20	0.27
	80	79.65	80.13	79.85	79.81	79.77	0.29	0.25	-0.60	—	0.10	0.19
	120	119.50	119.59	119.62	119.53	119.55	0.37	0.10	-0.07	—	0.07	0.11
	160	159.30	159.32	159.32	159.31	159.31	0.43	0.01	-0.01	—	0.05	0.09
	200	198.86	↑	199.42	199.01	199.09	0.46	0.28	—	—	0.04	0.19

付属品の検証(無)

レンジ (kN)	試験力 (kN)	④ 増加	①:④ (%)
50 kN (0.1)	0	0.00	—
	10	9.97	0.4
	20	19.95	0.1
	30	29.77	0.0
	40	39.69	0.1
	50	49.64	0.2

1.検査最大許容値

q.相対指示誤差(±1%)
b.相対繰り返し誤差(1%)
v.相対往復誤差(±1.5%)
f₀.相対零誤差(±0.1%)
a.相対分解能(±0.5%)

良
良
良
良
良
良
良
良
良
良
良
良

2.最大荷重検査

荷重負荷装置
荷重指示装置
荷重に対する装置
稼働範囲に対する装置

4.感度検査


5.据え付け検査

6.加圧板 推奨値(0.01mm以内/100mm・HRC55以上) 別紙参照

7.球面座の構造・作動

良
良
良

株式会社



計量士 竹田 和彦



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



COPY

8. 7. 月分
総数 4 頁中 1 頁

証明書番号 G240202



JCSS
JCSS 0098

校正証明書

依頼者名
依頼者の住所
計量器の名称
型式及び能力
器物番号及び管理番号
製造者名
指示装置及び番号
製造者名
校正方法
実施条件
校正結果
校正実施場所

一般社団法人日本計量振興協会 試験・校正センター
東京都新宿区納戸町25-1
ロードセル
圧縮型 : 1000 kN
ADM140297, 管理番号 : C1000k0297
ロードセル : 株式会社東京測器研究所
指示装置 : No.MY53002713
Agilent Technologies, Inc.
JIS B 7728 : 2013 による
2 頁のとおり
3 頁 ~ 4 頁のとおり
東京都新宿区納戸町25番1号
一般社団法人日本計量振興協会 (力計校正室)

受付年月日
校正実施年月日

2024年11月11日
2024年12月13日

力計の不確かさ 試験力の範囲	最大拡張不確かさ ($k=2$)	等級 (参考)
50 kN ~ 1000 kN	0.089 %	1

上記の拡張不確かさは、信頼の水準約95%に相当し包含係数 $k=2$ である

校正の結果は以上のとおりであることを証明する

2024年12月13日

東京都新宿区納戸町 25 番 1 号

一般社団法人 日本計量振興協会
試験・校正センター

センター長 白鳥 慎治



この証明書は計量法第 144 条 (第一項) に基づくものであり、特定標準器 (国家標準) にトレーサブルな特定二次標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。当協会の試験・校正センターは、ISO/IEC 17025:2017 (JIS Q 17025:2018) に適合しています。この証明書は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及びAPAC (アジア太平洋認定協力機構) のMRA (相互承認) に加盟しているIA Japanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。

原本と相違ありません。

田中フククリート工業(株) 検査工場

証明書番号 G240202

校正結果

力計の指示値(内挿値)

試験力 (kN)	指示装置の読み (mV/V) 増加	拡張不確かさ (k=2) (%)
0	-	-
50	0.10076	0.089
100	0.20121	0.067
200	0.40206	0.063
300	0.60284	0.063
400	0.80357	0.063
600	1.20487	0.063
800	1.6060	0.063
1000	2.0070	0.063

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数は2である。上記の校正結果は、増加及び減少する力の測定に適用できる。ただし、上記の拡張不確かさにはヒステリシスの不確かさが加算されている。

上記の校正結果は、校正範囲において下記の内挿校正式から内挿推定されるすべての力に適用できる。

内挿校正式

試験力 F (kN) から出力値 X (mV/V) を算出 :

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$

係数	試験力の増加
A_0	2.9350296E-04
A_1	2.0095349E-03
A_2	-3.6948181E-09
A_3	8.6281532E-13

出力値 X (mV/V) から試験力 F (kN) を算出 :

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

係数	試験力の増加
B_0	-1.4600082E-01
B_1	4.9762683E+02
B_2	4.5639788E-01
B_3	-5.2900102E-02

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横浜工場



COPY

8. 7. 月分

総数 4 頁中 1 頁

証明書番号 G240201



JCSS
JCSS 0098

校正証明書

依頼者名
依頼者の住所
計量器の名称
型式及び能力
器物番号及び管理番号
製造者名
指示装置及び番号
製造者名
校正方法
実施条件
校正結果
校正実施場所

一般社団法人日本計量振興協会 試験・校正センター
東京都新宿区納戸町25-1
ロードセル
圧縮型 : 200 kN
ADM180621, 管理番号 : C200k0621
ロードセル : 株式会社東京測器研究所
指示装置 : No.MY53002713
Agilent Technologies, Inc.
JIS B 7728 : 2013 による
2 頁のとおり
3 頁 ~ 4 頁のとおり
東京都新宿区納戸町25番1号
一般社団法人日本計量振興協会 (力計校正室)

受付年月日
校正実施年月日

2024年11月11日
2024年12月11日

力計の不確かさ	試験力の範囲	最大拡張不確かさ ($k=2$)	等級 (参考)
	10 kN ~ 200 kN	0.060 %	0.5

上記の拡張不確かさは、信頼の水準約95%に相当し包含係数 $k=2$ である

校正の結果は以上のとおりであることを証明する

2024年12月13日

東京都新宿区納戸町 25 番 1 号

一般社団法人 日本計量振興協会
試験・校正センター

センター長

白鳥

慎治



この証明書は計量法第 144 条 (第一項) に基づくものであり、特定標準器 (国家標準) にトレーサブルな特定二次標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。当協会の試験・校正センターは、ISO/IEC 17025:2017 (JIS Q 17025:2018) に適合しています。この証明書は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及びAPAC (アジア太平洋認定協力機構) のMRA (相互承認) に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。

原本と相違ありません。

田中コンクリート工業(株) 検査工場

証明書番号 G240201

校 正 結 果

試験力 (kN)	力 計 の 指 示 値 (内挿値)	
	指示装置の読み (mV/V)	拡張不確かさ (k=2) (%)
0	-	-
10	0.10034	0.060
20	0.20059	0.042
40	0.40112	0.040
60	0.60166	0.040
100	1.00277	0.040
120	1.20334	0.040
160	1.60447	0.040
200	2.00558	0.040

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数は2である。上記の校正結果は、増加及び減少する力の測定に適用できる。ただし、上記の拡張不確かさにはヒステリシスの不確かさが加算されている。

上記の校正結果は、校正範囲において下記の内挿校正式から内挿推定されるすべての力に適用できる。

内挿校正式

試験力 F (kN) から出力値 X (mV/V) を算出 :

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$


係数	試験力の増加
A_0	8.7599942E-05
A_1	1.0024696E-02
A_2	2.9206135E-08
A_3	-7.6775102E-11


出力値 X (mV/V) から試験力 F (kN) を算出 :

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

係数	試験力の増加
B_0	-8.7375592E-03
B_1	9.9753642E+01
B_2	-2.8969141E-02
B_3	7.5940928E-03

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



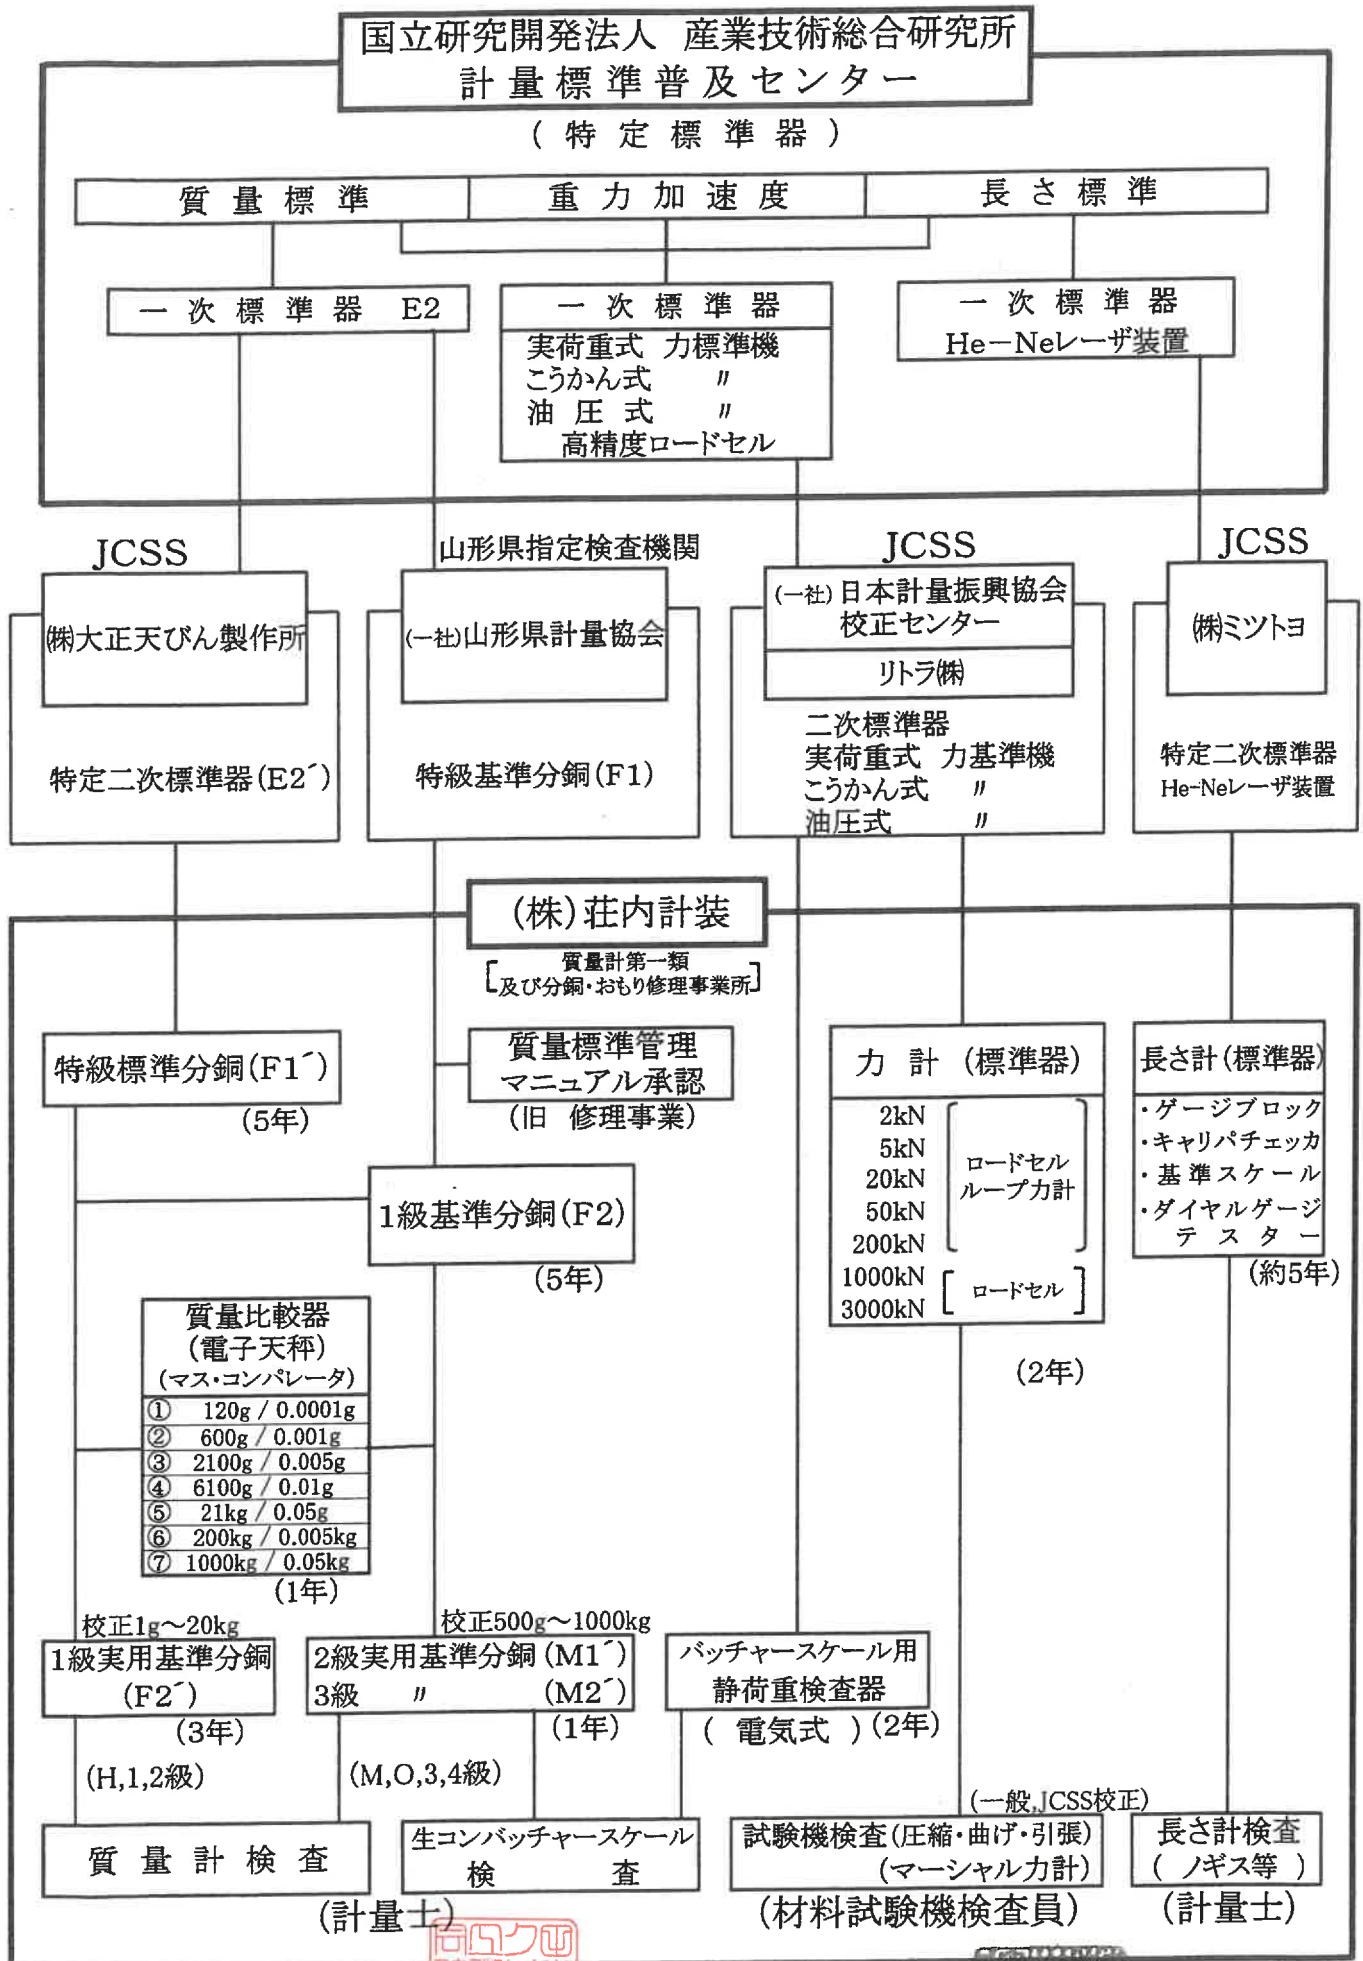

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 橋本工場

2024.1

株式会社 荘 内 計 装

〒998-0061 山形県酒田市長生1-7-18
tel 0234-33-2011 fax 0234-33-2001
